

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Work	Start	Finish
0		harmonogram	240 hrs	450 hrs	Fri 2.10.26	Tue 2.03.27
1		UX / Game Design	80 hrs	80 hrs	Fri 2.10.26	Fri 20.11.26
2		Projekt głównych mechanik rozgrywki	30 hrs	30 hrs	Fri 2.10.26	Mon 19.10.26
3		Projekt flow rozgrywki i tempa gry	15 hrs	15 hrs	Tue 20.10.26	Fri 30.10.26
4		Projekt typów przeciwników	15 hrs	15 hrs	Tue 20.10.26	Fri 30.10.26
5		Projekt poziomów z zagadkami logicznymi	20 hrs	20 hrs	Fri 30.10.26	Tue 10.11.26
6		Game Design Document (GDD) zatwierdzony	0 hrs	0 hrs	Fri 20.11.26	Fri 20.11.26
7						
8		Backend	150 hrs	254 hrs	Mon 23.11.26	Tue 23.02.27
9		**Poziomy**	**40 hrs**	**52 hrs**	**Mon 23.11.26**	**Tue 15.12.26**
10		Ustrukturyzowanie danych poziomów i przeciwników	8 hrs	8 hrs	Mon 23.11.26	Tue 24.11.26
11		Implementacja kreatora poziomów	40 hrs	40 hrs	Mon 23.11.26	Tue 15.12.26
12		Konfiguracja parametrów przeciwników	4 hrs	4 hrs	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26
13		Mechaniki	150 hrs	202 hrs	Mon 23.11.26	Tue 23.02.27
14		System kolizji i fizyki	70 hrs	70 hrs	Mon 23.11.26	Mon 4.01.27
15		Implementacja mechaniki parowania	70 hrs	70 hrs	Mon 4.01.27	Tue 16.02.27
16		Obsługa zmiany momentum po sparowaniu	10 hrs	10 hrs	Fri 19.02.27	Tue 23.02.27
17		Implementacja odbijania pocisków	10 hrs	10 hrs	Fri 19.02.27	Tue 23.02.27
18		Logika przeciwników	34 hrs	34 hrs	Mon 23.11.26	Mon 14.12.26
19		Obsługa stanu gry (wygrana, przegrana, restart)	4 hrs	4 hrs	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26
20		Przechowywanie postępu gracza	4 hrs	4 hrs	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26
21		Feature Complete (Zakończenie prac programistycznych	0 hrs	0 hrs	Tue 23.02.27	Tue 23.02.27
22						
23		**Frontend**	**30 hrs**	**40 hrs**	**Mon 23.11.26**	**Tue 8.12.26**
24		Implementacja interfejsu użytkownika (menu główne, pauza, ekran końcowy)	4 hrs	4 hrs	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26
25		Wyświetlanie HUD (życie, postęp, komunikaty)	4 hrs	4 hrs	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26
26		Obsługa sterowania postacią	10 hrs	10 hrs	Mon 23.11.26	Fri 27.11.26
27		Integracja animacji postaci i przeciwników	20 hrs	20 hrs	Fri 27.11.26	Tue 8.12.26
28		Implementacja przejść między ekranami gry	2 hrs	2 hrs	Mon 23.11.26	Mon 23.11.26
29		Gotowy działający Frontend	0 hrs	0 hrs	Tue 8.12.26	Tue 8.12.26
30						
31		**Grafika / UI**	**20 hrs**	**44 hrs**	**Fri 2.10.26**	**Tue 13.10.26**
32		Przygotowanie sprite'ów postaci	5 hrs	5 hrs	Fri 2.10.26	Mon 5.10.26
33		Przygotowanie sprite'ów przeciwników	5 hrs	5 hrs	Fri 2.10.26	Mon 5.10.26
34		Przygotowanie sprite'ów elementów poziomów	15 hrs	15 hrs	Fri 2.10.26	Mon 12.10.26
35		Animacje ataku i parowania	15 hrs	15 hrs	Mon 5.10.26	Tue 13.10.26
36		Projekt elementów interfejsu	4 hrs	4 hrs	Fri 2.10.26	Mon 5.10.26
37		Komplet assetów graficznych	0 hrs	0 hrs	Tue 13.10.26	Tue 13.10.26
38						
39		**Testy**	**7 hrs**	**12 hrs**	**Tue 23.02.27**	**Mon 1.03.27**
40		Testy mechaniki parowania	2 hrs	2 hrs	Tue 23.02.27	Fri 26.02.27
41		Testy poziomów logicznych	2 hrs	2 hrs	Tue 23.02.27	Fri 26.02.27

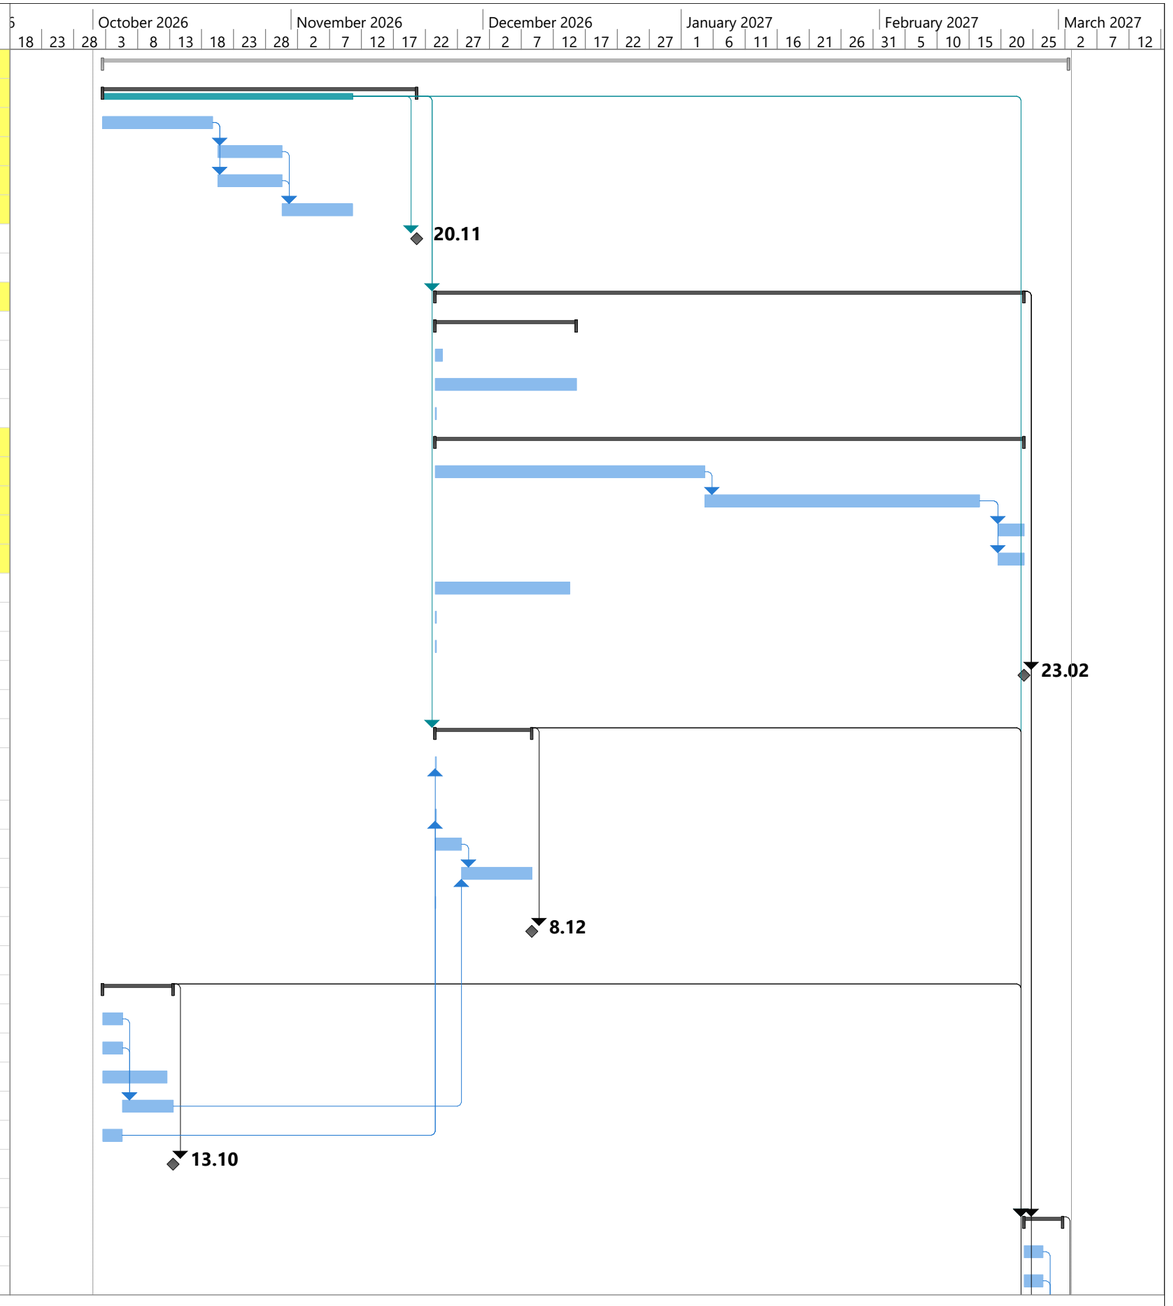

Project: harmonogram
Date: Sun 19.04.26

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Work	Start	Finish
42		Testy systemu kolizji	2 hrs	2 hrs	Tue 23.02.27	Fri 26.02.27
43		Testy wydajności	1 hr	1 hr	Tue 23.02.27	Tue 23.02.27
44		Testy końcowe wersji grywalnej	5 hrs	5 hrs	Fri 26.02.27	Mon 1.03.27
45		Wersja Release Candidate (Gra przetestowana i stabilna)	0 hrs	0 hrs	Mon 1.03.27	Mon 1.03.27
46						
47		Promocja / prezentacja	10 hrs	20 hrs	Tue 23.02.27	Tue 2.03.27
48		Przygotowanie prezentacji projektu	4 hrs	4 hrs	Tue 23.02.27	Fri 26.02.27
49		Nagranie materiałów demonstracyjnych	2 hrs	2 hrs	Tue 23.02.27	Fri 26.02.27
50		Utworzenie landing page'a projektu	10 hrs	10 hrs	Tue 23.02.27	Tue 2.03.27
51		Demo gry dla nowego rocznika	4 hrs	4 hrs	Tue 23.02.27	Fri 26.02.27
52		Zakończenie projektu i udostępnienie dema	0 hrs	0 hrs	Tue 2.03.27	Tue 2.03.27

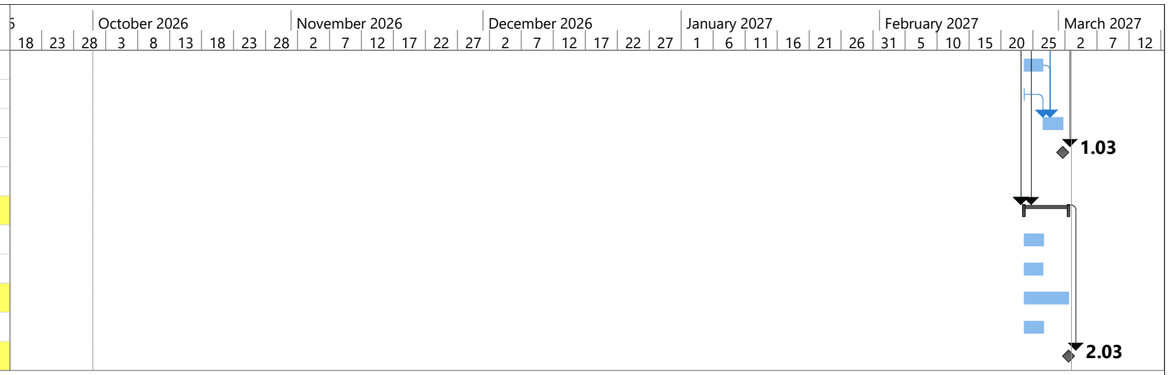

Project: harmonogram
Date: Sun 19.04.26

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone
